

成都科宏达科技有限公司

关于土地隐患排查整改的报告

成都市新津生态环境局：

2022年5月，我公司邀请四川科盛新环境科技有限公司对我司土壤污染风险进行了隐患排查。对存在的问题，提出了整改意见。我公司高度重视，针对存在的问题组织召开了整改会议。现将整改情况汇报如下：


问题1—4：1个污水处理池、1个应急水池、2个废水暂存池，污水沟和池体已做防渗水泥硬化，表面无法查看池底是否渗漏，该池体可能存在渗漏隐患。

整改措施：工程部已进行检查，抽干水检查池底也不存在破损、渗漏现象。

整改责任人：林建东

验收责任人：林俊平

完成时间：2022年6月18日已完成整改工作。

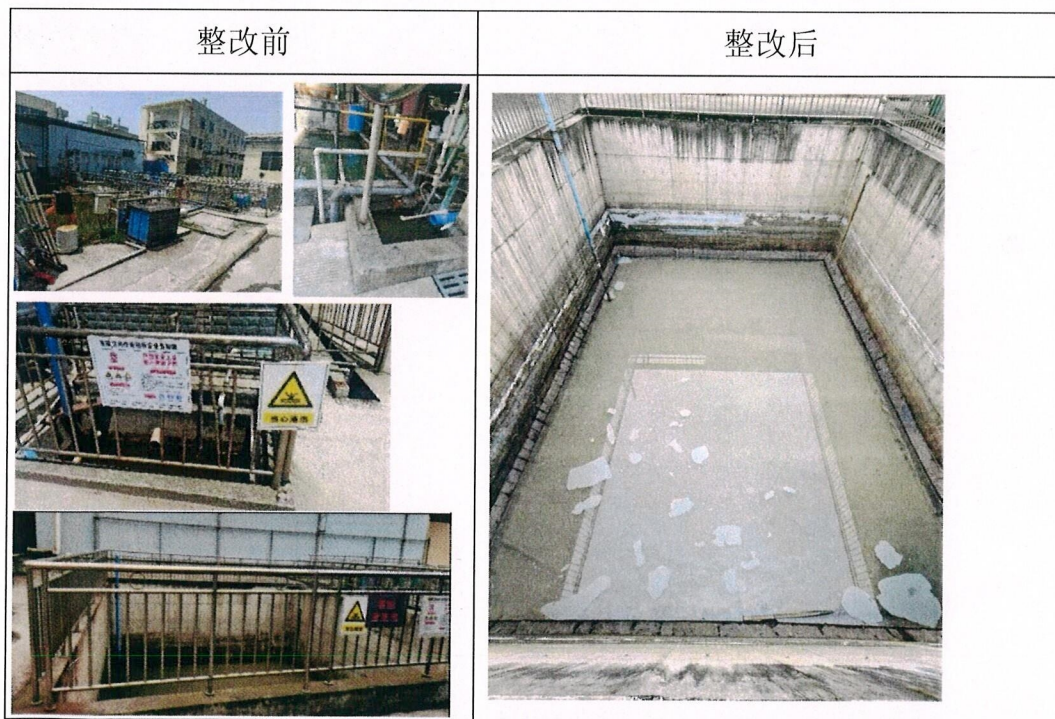

问题5：罐体周围雨水较多，不易发现泄漏情况，同时水泥地面有裂缝。


整改措施：已清理罐体周围雨水，并保证排水管通畅。对裂缝进行了修补。

整改责任人：林建东

验收责任人：林俊平

完成时间：2022年6月26日已完成整改工作。



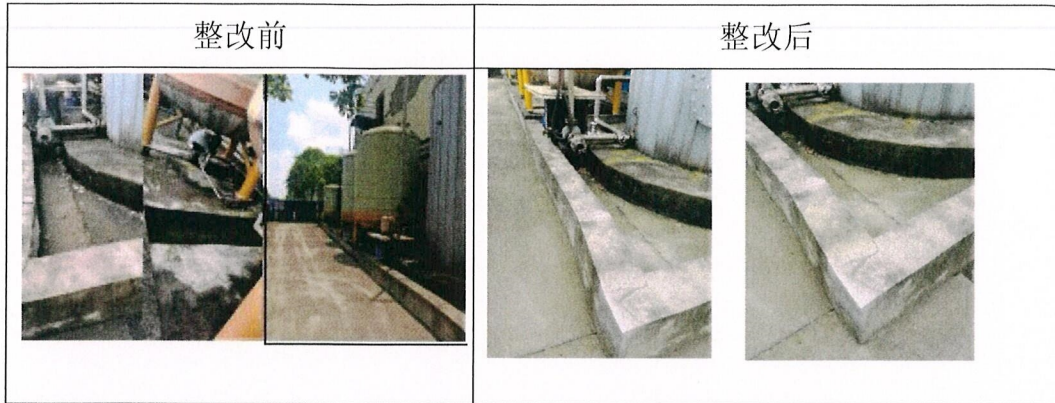

问题 6：收集沟未全部打开，部分管道可能存在积液和破损。

整改措施：安装雨水算子和可移动钢板，目视无积液和破损现象。打开盖板，定期目视检查有无积液和破损。

整改责任人：林建东

验收责任人：林俊平

完成时间：2022 年 6 月 1 日已完成整改工作。



问题 7：车间原料或产品在使用过程中滴落的废液沿着水泥地面流入雨水沟。

整改措施：严格要求生产车间将使用后的液体原料或产品桶暂存于车间内，由车间主任、生产经理严格监督并考核。

整改责任人：王建

验收责任人：林俊平

完成时间：2022 年 6 月 1 日已完成整改工作。




问题 8：液体原料或液体产品部分堆存于未做硬化的厂区围墙处或已做硬化但已开裂水泥地面。

整改措施：已将存放在围墙边的清洗废水收入库房。

整改责任人：高梅菲

验收责任人：林俊平

完成时间：2022 年 6 月 3 日已完成整改工作。

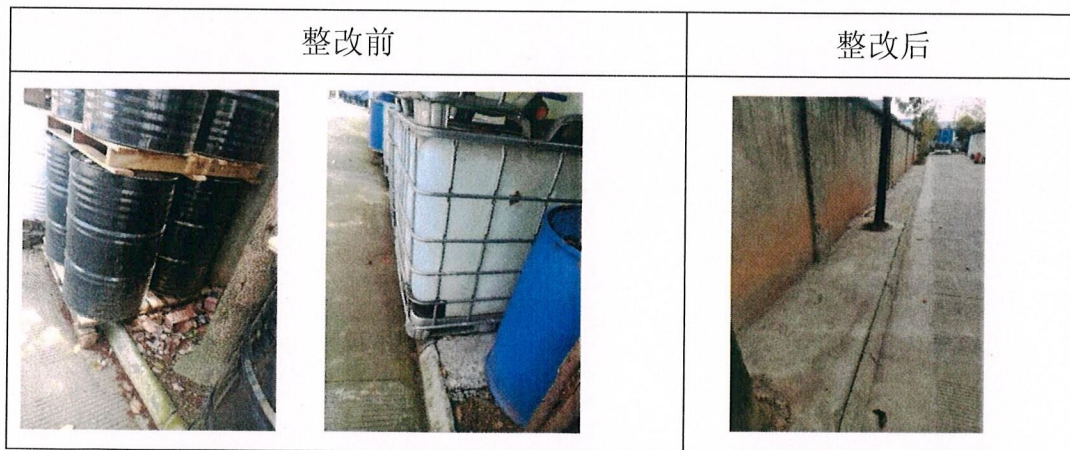



问题 9：厂区雨水沟未与外界封闭，大量液体原料或产品堆放于厂区道路，一旦泄漏，造成大量化学品通过雨水管道流入外环境。

整改措施：将有物料的吨桶收入库房，此处已进行规划，用于暂存新的产品桶。

整改责任人：王建

验收责任人：林俊平

完成时间：2022 年 6 月 3 日已完成整改工作。

| 整改前 | 整改后 |
|---|--|
|  |  |



问题 10：危化品库地面环氧地坪破损，防渗能力降低。

整改措施：已对库房破损地面进行修复。

整改责任人：林建东

验收责任人：林俊平

完成时间：2022 年 6 月 25 日已完成整改工作。
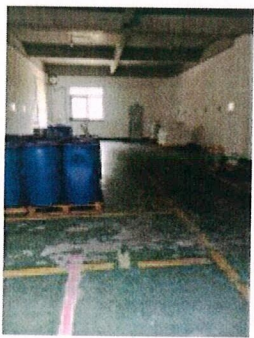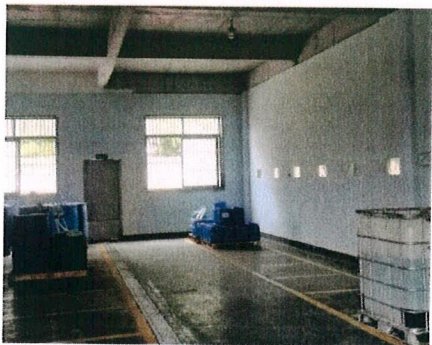
| 整改前 | 整改后 |
|---|--|
|  |  |

问题 11：生产区部分地面环氧地坪已磨损，防渗系数降低。


整改措施：已对厂区内破损地面进行修复。

整改责任人：林建东

验收责任人：林俊平

完成时间：2022 年 6 月 25 日已完成整改工作。



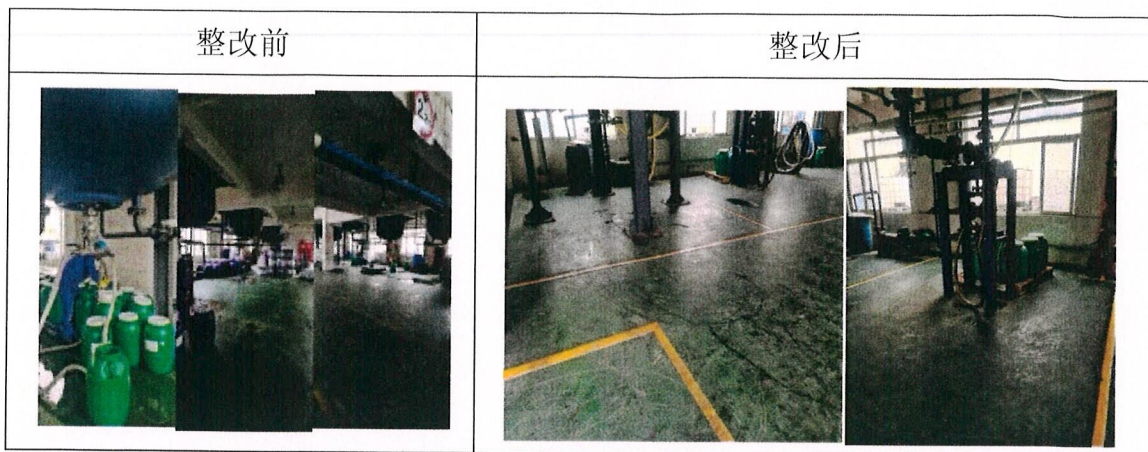

问题 12：部分泄漏的危险废物长期浸泡环氧地坪地面未得到有效清理，容易造成环评地坪腐蚀进而危险废物渗漏进地底。

整改措施：已清理危废间地面物料。

整改责任人：罗桂芝

验收责任人：林俊平

完成时间：2022年6月3日已完成整改工作。



成都科宏达科技有限公司

2022年6月29日

